


Rv70 Trollsvingen/Røsslyngveien og kollektivfelt Goma-Atlanten

Orientering til styringsgruppemøte 18.september 2026


Prosjektleder Statens vegvesen Halgeir Brudeseth

Bypakke Kristiansund

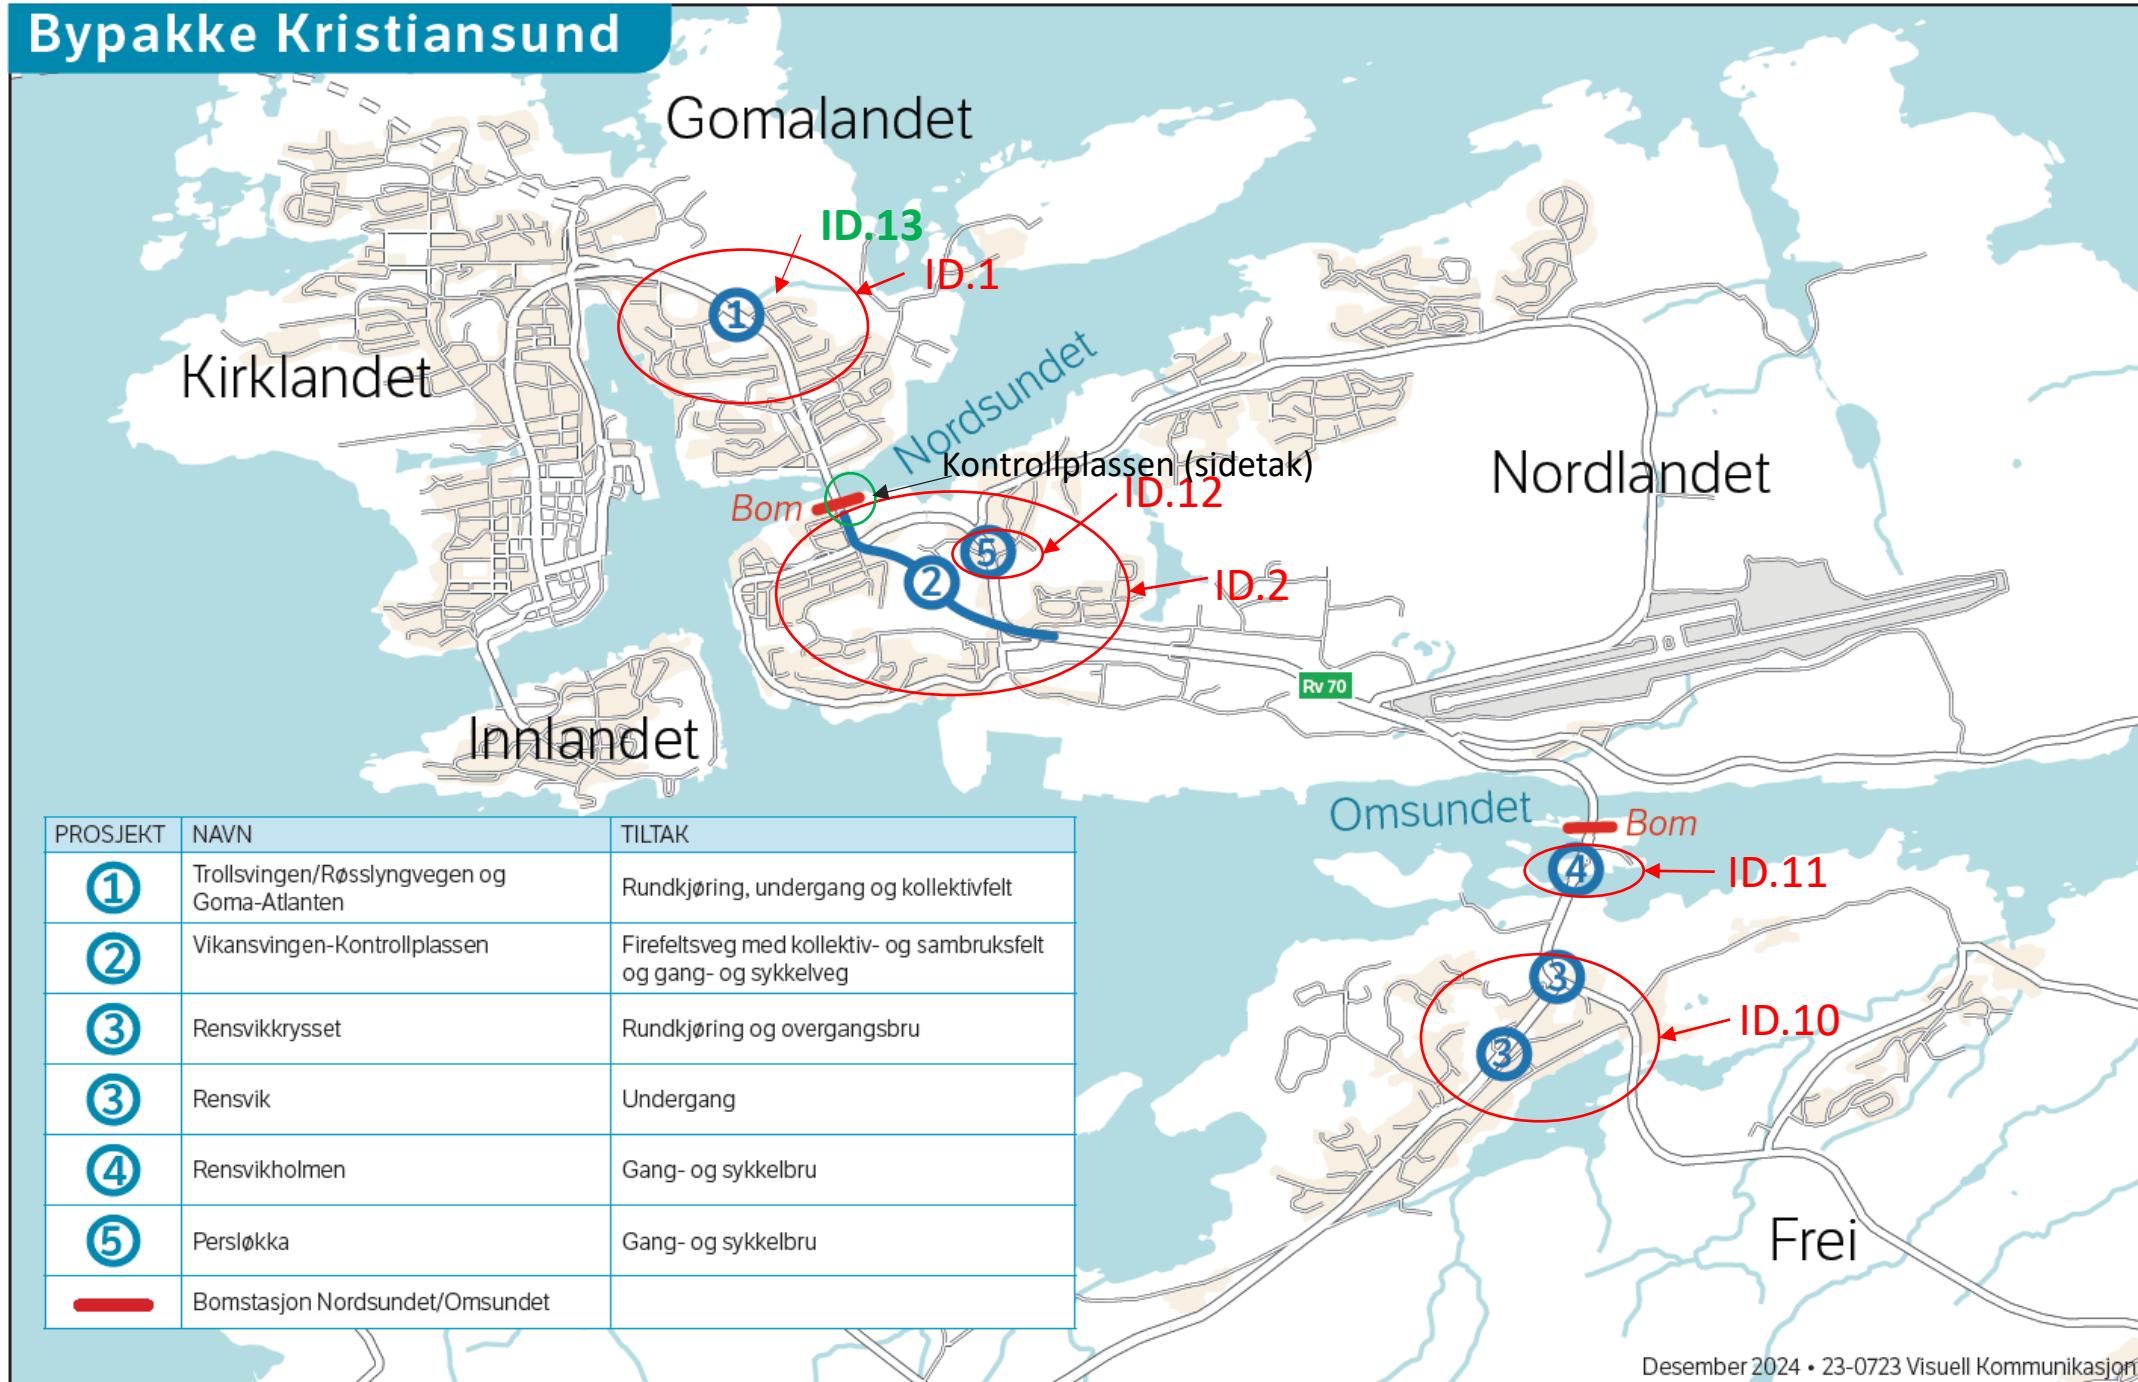

Framdriftsplan* og kostnad

Mars 2026

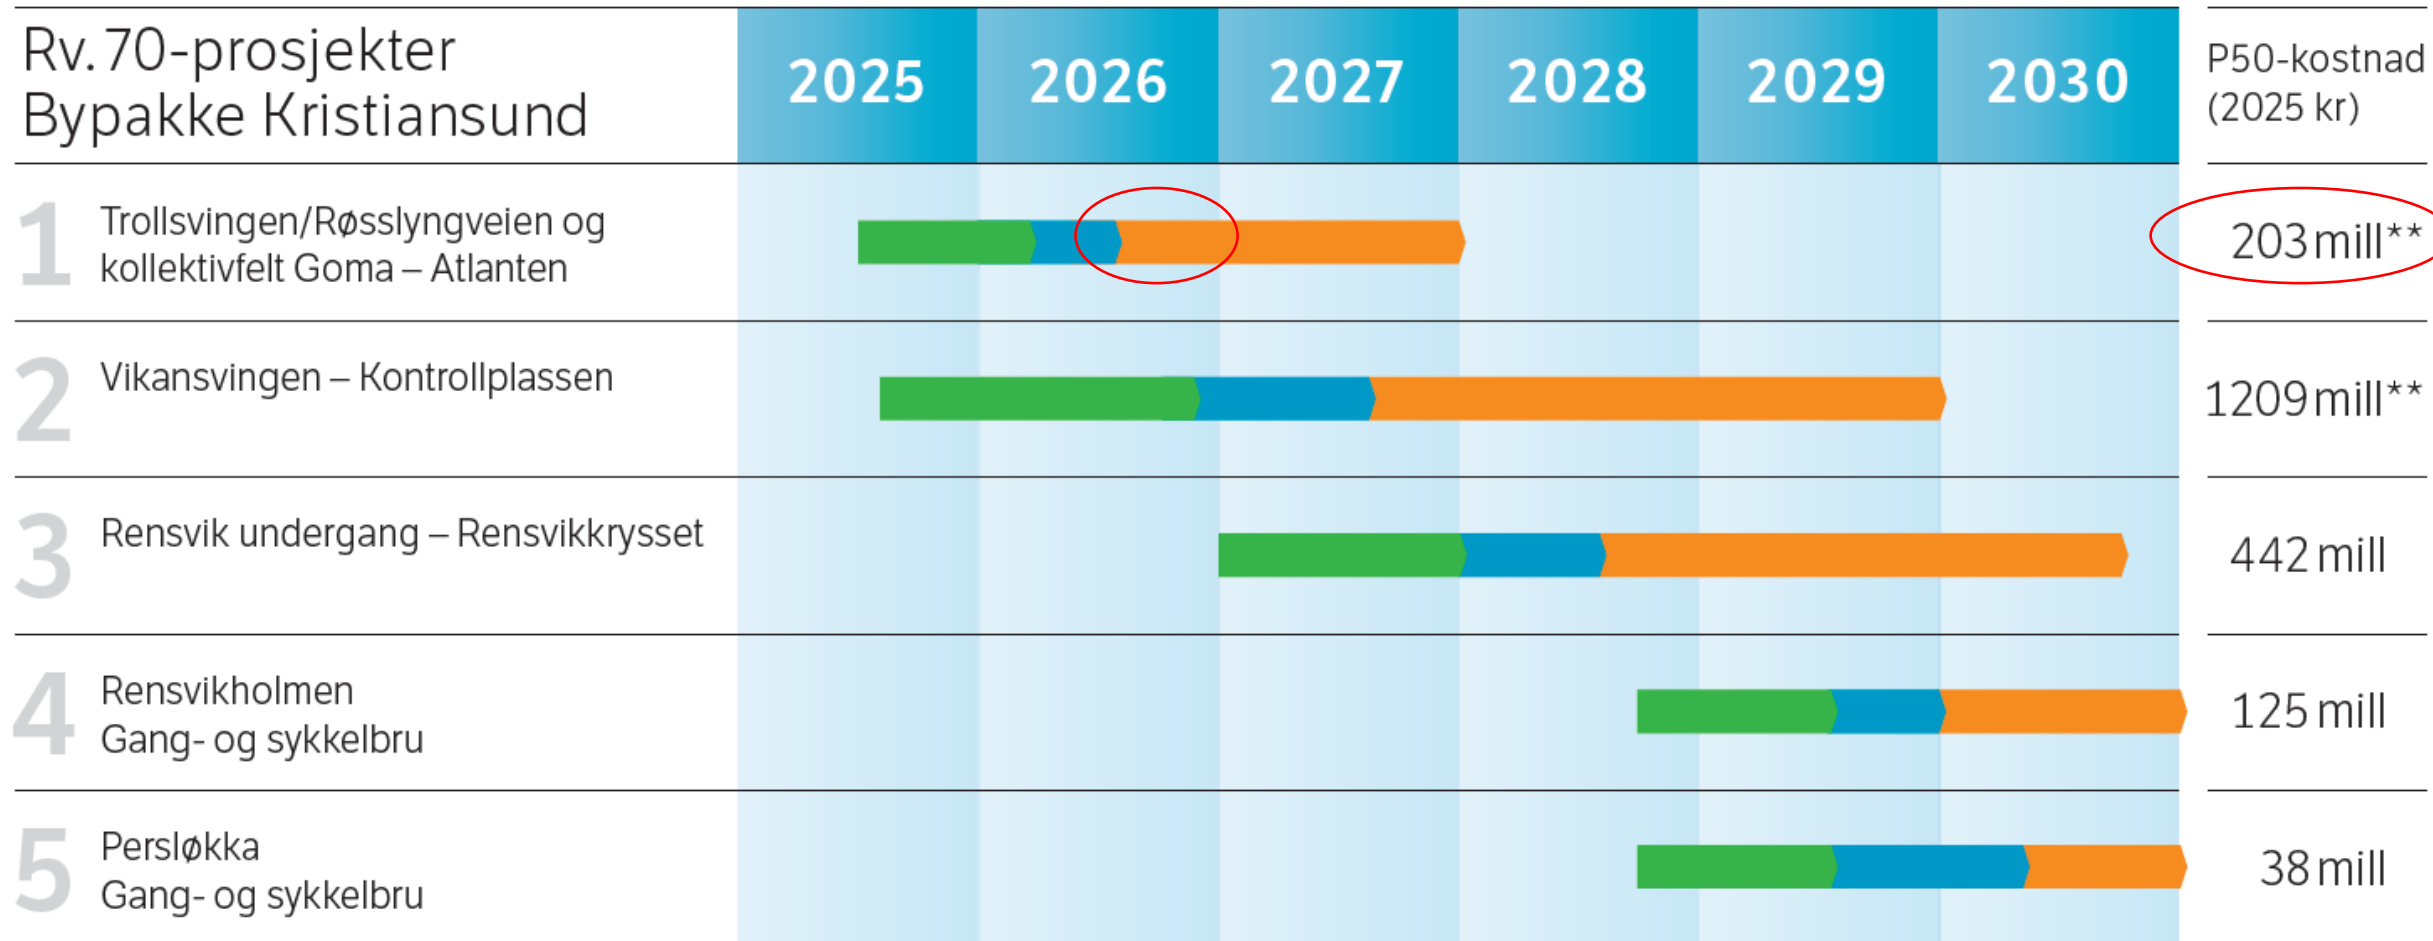

*Uttlysning besluttet av styringsgruppa

** Styringsramme



Prosjektering/Byggeplan



Anskaffelse/Kontrahering



Bygging

Tilbud – kontrakt - entreprenører:

Tilbud (inkl. mannskaps- og maskintimer og ID.13, ekskl. mva)

- ACO Anlegg: 93,7 mill.kr.
- KN Entreprenør AS: 107,3 mill.kr.
- AF B45 Anlegg AS/Strøm Gundersen AS: 164,2 mill.kr.

Kontrakt (inkl. ID.13, ekskl. mannskaps- og maskintimer og mva)

- Hovedentreprenør: **ACO Anlegg: 87,296 mill.kr.**
- Underentreprenører: Mekvik Maskin AS, Søvik & Skåravik AS, EVO Teknikk AS, Veidekke Industri AS

Anskaffelse/kontrahering/oppstart

- Tilbudsfrist 10.juni 2026
- Tre tilbud
- Tilbudsbrev 22.juni, karenperiode 10 dager, ingen klager
- Kontraktsignering **2.juli**
- Samhandlingsmøter 17.-18.august
- Åpent informasjonsmøte 18.august
- Første spadetak **19.august**
- **Ferdigstillelsesfrist 1.oktober 2027**

Status 17.september 2026; ved Atlanten





Status 17.09.26, ved Folkeparken





Status 17.september 2027: sidetak Kontrollplassen





Kommunikasjon/informasjon


- Pressemeldinger/nettsidesaker om:
 - Tilbud
 - Tildeling
 - Informasjonsmøte
 - Første spadestikk
- Initieres av prosjektleder til...
- ..Kommunikasjonsrådgiver SVV (Ole Kristian Åset) som har kontakt mot..
 - ...Kommunikasjonsrådgiver Aleksander F. Heggdal (som legger ut saker på nettsida)
 - ...Media (lokale (TK, NP, KSU og regionalt (NRK))

Viktig informasjon til trafikanter:


Fase 1: til des 26/jan 27: all trafikk som i dag, bygging N



Fase 2: des 26/jan 27: fortau sør stenges, flytter riksveg 70 mot sør, blåbrua rives, bygging nordlig delområde

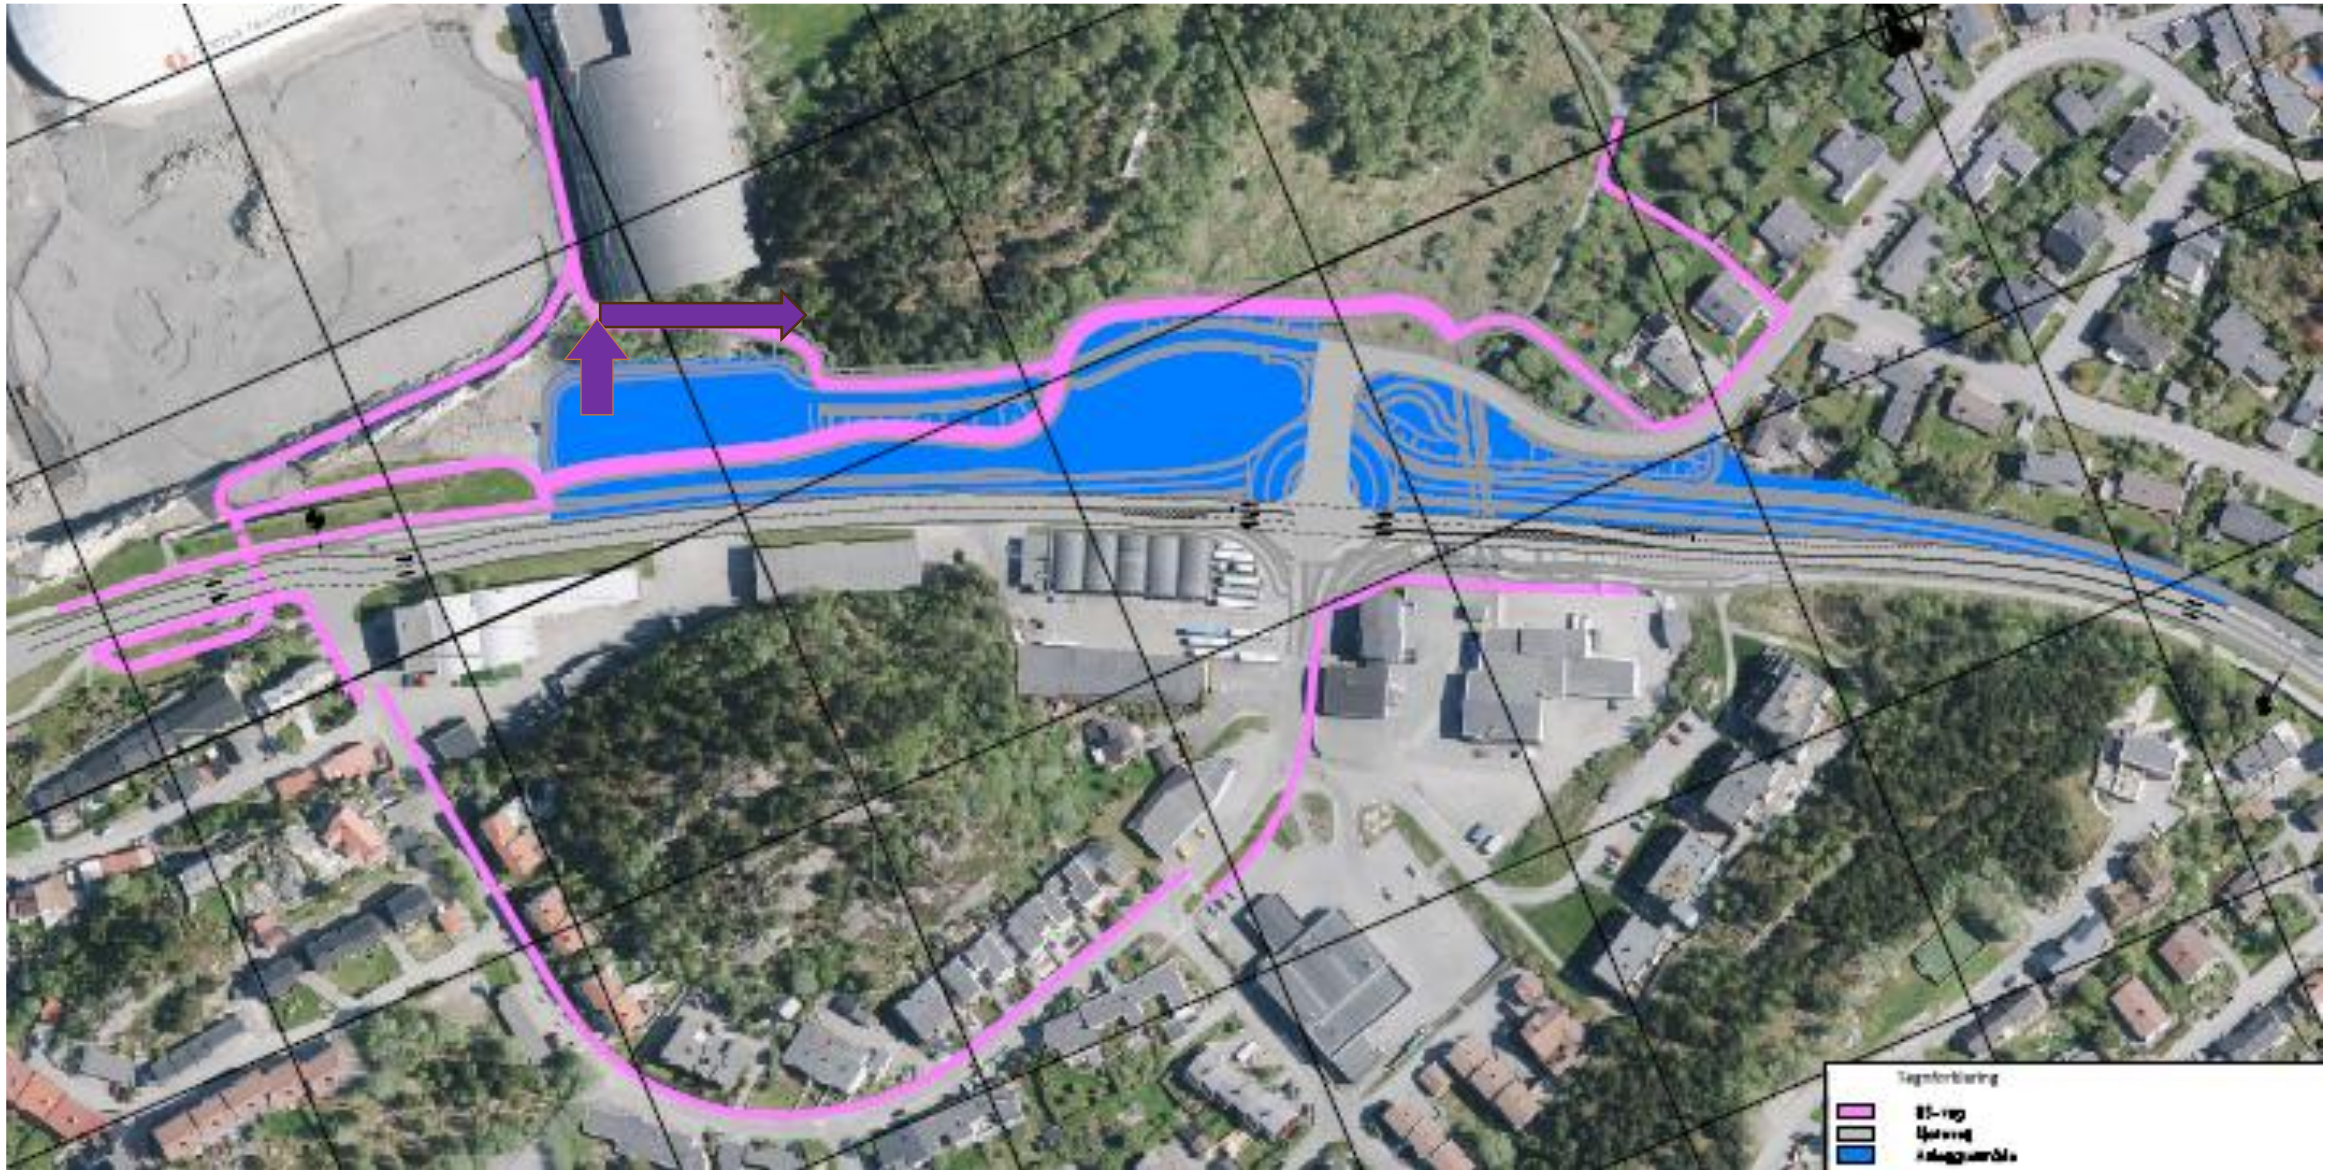

Fra fase 2: gs-trase med planfri kryssing av rv70

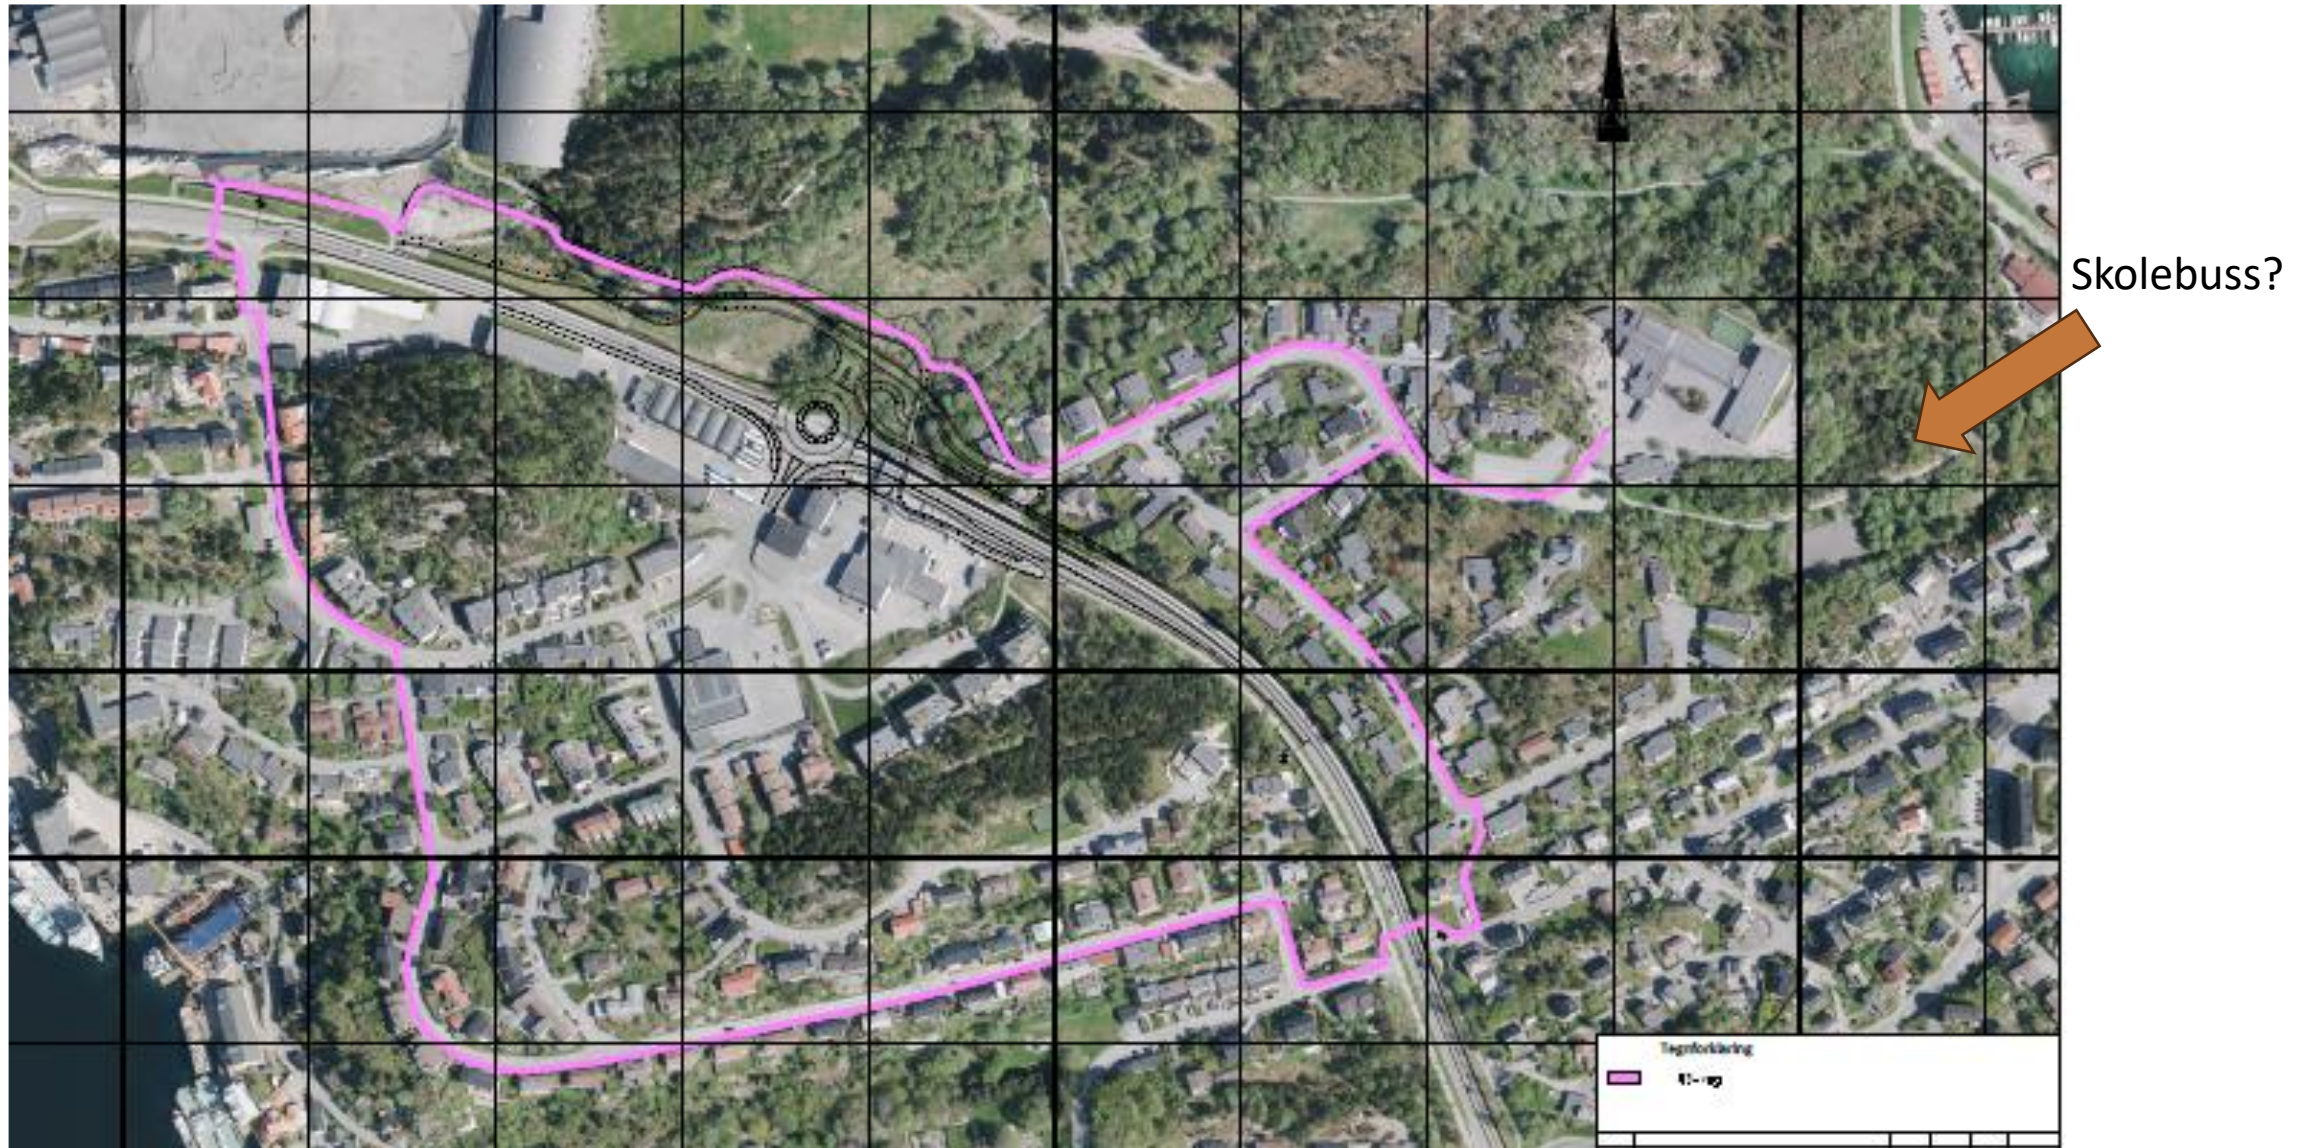

Fase 3: bygging sørlig delområde



Byggeplan Rv70 Trollsvingen-Røsslyngveien mv.

