



MØTE I STYRINGSGRUPPEN FOR BYPAKKE KRISTIANSUND 24.04.26

Adm.dir Kristian Steinshylla

STATUS FOR PROSJEKTET




Prop. 87 S

(2024–2025)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Utbygging og finansiering av
Bypakke Kristiansund i Møre og Romsdal



Oppstartsdato: **mandag 1. juni 2026**

Vegamot har søkt Statens Vegvesen (SVV) om takstvedtak, og har fått dette innvilget iht. vanlig prosedyre. Planlagt **kunngjøring; 27.04** (5 uker før oppstart) – dvs. i etterkant av innbyggermøte.

REVIDERT TIDSLINJE FREM TIL OPPSTART



Grunnarbeid

- Trekkør
- Fundament
- Portaler
- Tilkobling Strøm

Installasjon

- Installasjon av bomstasjon

Klargjøring


- Q-Free Konfigurasjon
- Q-free Test

Kvalitetssikring

- Vegamot testing



Oppstart

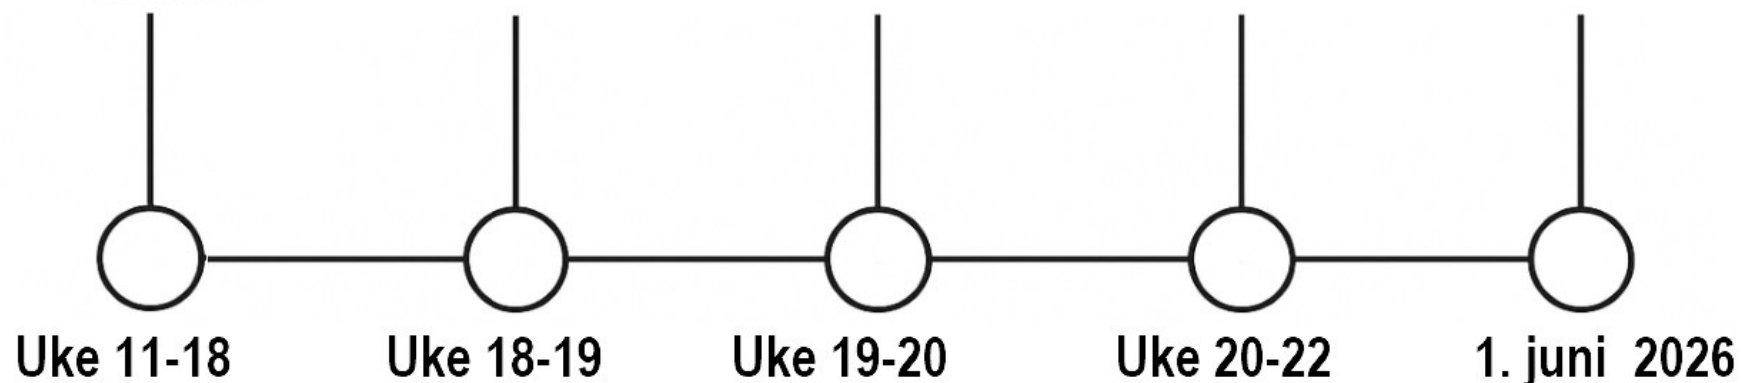

FUNDAMENT OG PORTALER

Fundamentene er nå ferdig støpt, og trekkør er lagt frem.

Saferoad (portalleverandør) har bekreftet levering tidligst fredag 24.04, mest trolig uken etter.

Nordsundet/Kontrollplassen



Omsundet



STRØM, FIBER OG SKAP

Strøm og fiber:

Status pr 16.04 (iht opplysninger fra Frank Halvor Melby):

Avtalen med Mellom på fordeling av anleggskostnader er signert. Trekking av kabel gjenstår her.

Fiber: Trekkør er lagt, fiber gjenstår.

Skiltplan for takst-skilt i bomstasjonsområdet er sendt til godkjenning 16.04.26.

Skiltplan utenfor bomstasjonsområdet er under kartlegging av SVV, søknad er ikke sendt.

Teknisk skap:

Blir hengende på portalen.

RV 70 Nordsundet bru – Skap må stå på samme side som strøm kommer fra.

RV 70 Omsundet bru – Skap må stå på høyre side når man kjører mot byen.

Iloq-låser ble levert til Q-Free 16.04.

VI FØLGER OPP OG RAPPORTERER:

- Trafikkutvikling
- Inntektsutvikling
- Gjennomsnittspris
- Andel nullutslippskjøretøy
- Fritakspasseringer
- Andre behov etter avtale

Vi har god erfaring med tett og god dialog opp mot sekretariater i bypakker.



Vegamot AS

Vegamot 4A

7048 Trondheim

Tlf. +47 73 82 48 80
